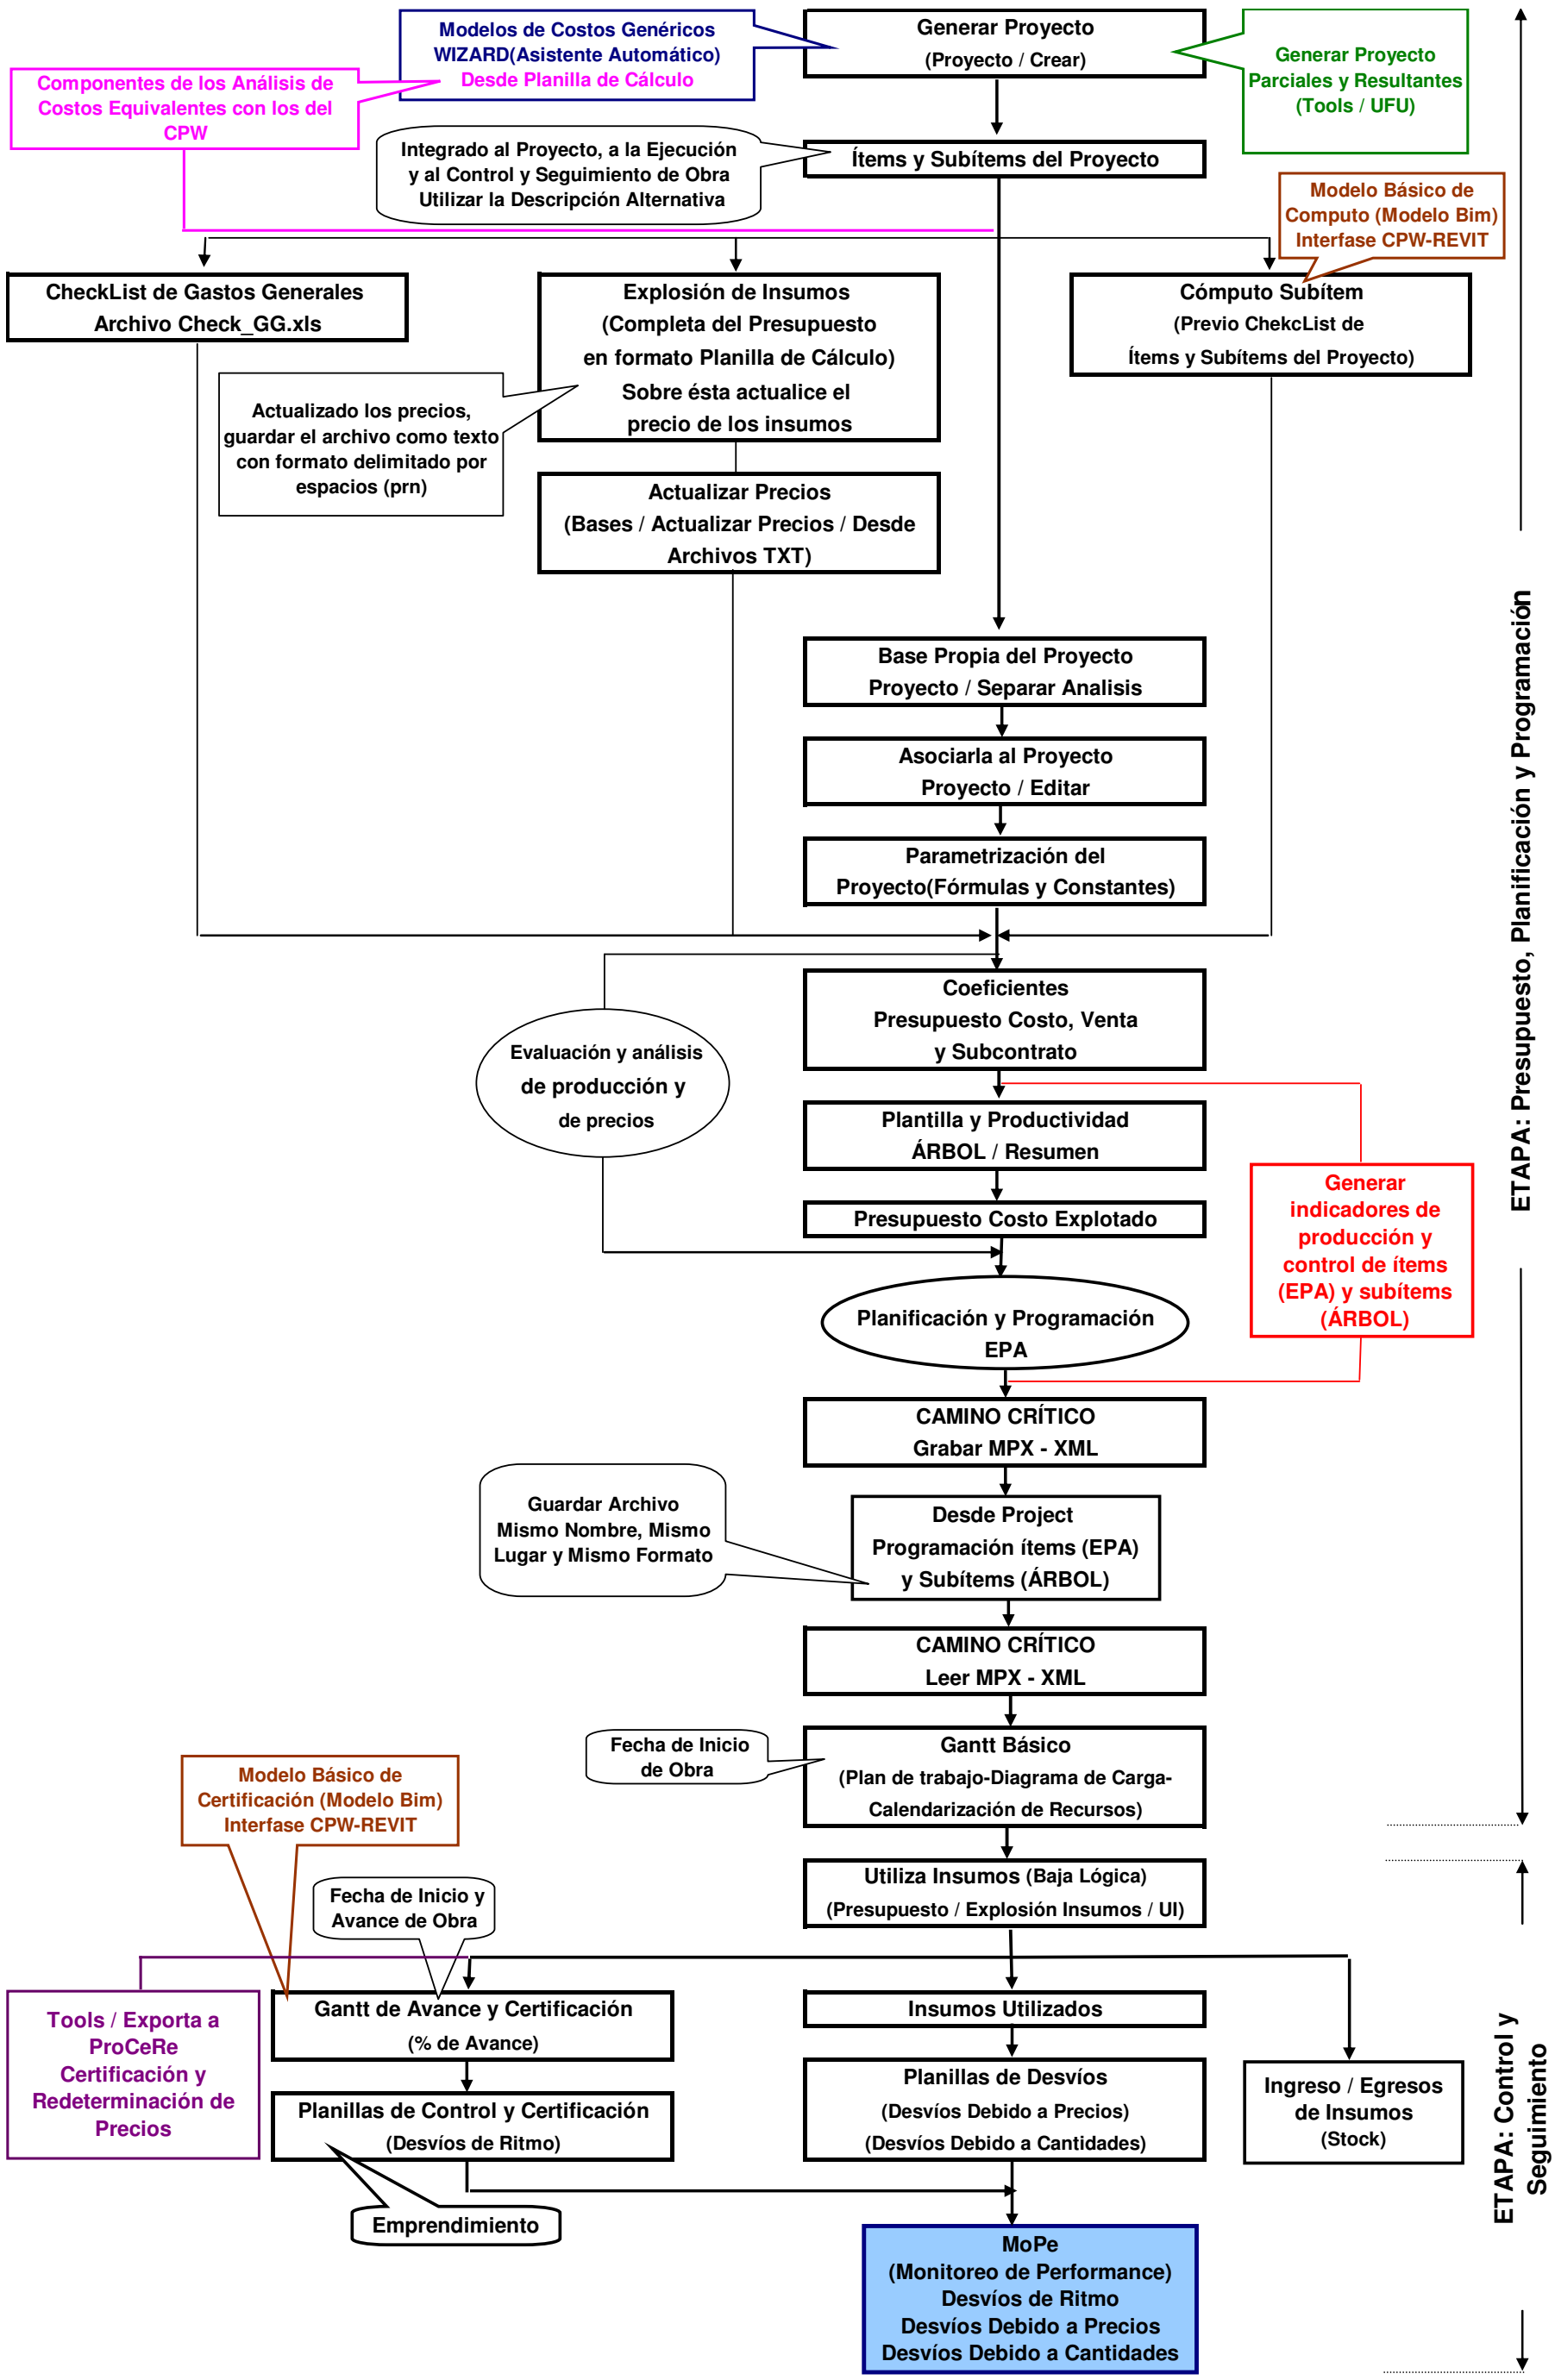
Modelos de Costos Genéricos
WIZARD(Asistente Automático)
Desde Planilla de Cálculo
Generar Proyecto
(Proyecto / Crear)
Generar Proyecto
Parciales y Resultantes
(Tools / UFU)
Componentes de los Análisis de Costos Equivalentes con los del CPW
Integrado al Proyecto, a la Ejecución y al Control y Seguimiento de Obra
Utilizar la Descripción Alternativa
Ítems y Subítems del Proyecto
Modelo Básico de Computo (Modelo Bim)
Interfase CPW-REVIT
CheckList de Gastos Generales
Archivo Check_GG.xls
Explosión de Insumos
(Completa del Presupuesto
en formato Planilla de Cálculo)
Sobre ésta actualice el
precio de los insumos
Cómputo Subítem
(Previo ChekcList de
Ítems y Subítems del Proyecto)
Actualizado los precios, guardar el archivo como texto con formato delimitado por espacios (prn)
Actualizar Precios
(Bases / Actualizar Precios / Desde Archivos TXT)
Base Propia del Proyecto
Proyecto / Separar Analisis
Asociarla al Proyecto
Proyecto / Editar
Parametrización del
Proyecto(Fórmulas y Constantes)
Coeficientes
Presupuesto Costo, Venta
y Subcontrato
Evaluación y análisis
de producción y
de precios
Plantilla y Productividad
ÁRBOL / Resumen
Presupuesto Costo Explotado
Generar indicadores de producción y control de ítems (EPA) y subítems (ÁRBOL)
Planificación y Programación
EPA
CAMINO CRÍTICO
Grabar MPX - XML
Guardar Archivo
Mismo Nombre, Mismo
Lugar y Mismo Formato
Desde Project
Programación ítems (EPA)
y Subítems (ÁRBOL)
CAMINO CRÍTICO
Leer MPX - XML
Fecha de Inicio
de Obra
Gantt Básico
(Plan de trabajo-Diagrama de Carga-
Calendarización de Recursos)
ETAPA: Presupuesto, Planificación y Programación
Modelo Básico de
Certificación (Modelo Bim)
Interfase CPW-REVIT
Utiliza Insumos (Baja Lógica)
(Presupuesto / Explosión Insumos / UI)
Fecha de Inicio y
Avance de Obra
Tools / Exporta a
ProCeRe
Certificación y
Redeterminación de
Precios
Gantt de Avance y Certificación
(% de Avance)
Insumos Utilizados
Planillas de Control y Certificación
(Desvíos de Ritmo)
Planillas de Desvíos
(Desvíos Debido a Precios)
(Desvíos Debido a Cantidades)
Ingreso / Egresos
de Insumos
(Stock)
Emprendimiento
MoPe
(Monitoreo de Performance)
Desvíos de Ritmo
Desvíos Debido a Precios
Desvíos Debido a Cantidades
ETAPA: Control y Seguimiento
